

新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負 工事かわら版

建設工事の進捗も順調に進み、当初の予定どおり9月よりプラント工事に着手いたしました。また皆様方にも新ごみ処理施設（工場棟）全体の形がはっきり見えてきたかと思えます。今後も平成31年度の稼働に向け安全第一を念頭に置き、引続き歩行者及び通行車両の安全には十分配慮して工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

◇ 工事の概要

工期：平成27年6月23日～平成31年3月31日
建物：地下3階 地上10階
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

◇ 工事現況

建築工事については、7月から9月までごみピットく体工事（地下）、鉄骨工事、外壁工事、各階く体工事、駐車場棟等基礎工事を実施いたしました。今後は工程表に示すとおり継続工事の施工を行います。

プラント工事については、8月に三菱仮設事務所設置を完了し、9月よりマテリアルリサイクルエリア工事を開始いたしました。10月からは炉室エリアの工事に着手してまいります。

◇ 工程表

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
建築工事	ごみピットく体工事（地下）			内部仕上げ工事		
		鉄骨工事				
			外壁工事、各階く体工事			
			駐車場棟等基礎工事（掘削工事含む）			
プラント工事	三菱仮設事務所設置工事			マテリアルリサイクルエリア工事		
					炉室エリア工事	
	注）赤→は工事完了を示す					

◇ 環境について

工事車両及び工事用重機に対し、特に下記事項を徹底して作業を行います。
工事用ゲートには交通誘導員を配備し、円滑な車両誘導を行います。

- ① 搬出入ルートの指導徹底（新規入場教育、送り出し教育時指導）
- ② 場内待機車両 アイドリングストップの徹底
- ③ 資材の飛散防止対策の徹底

◇ 安全について


高所での作業及び大型建設機械を使用するの楊重作業がメインとなります。
下記事項を徹底して作業を行います。

- ① 高所・開口部からの墜落災害防止
- ② 作業手順の確認にて不安全行動の撲滅
- ③ 火災、感電、漏電災害の防止
- ④ 第三者災害の防止

工事現況



全景 H29年9月末 撮影

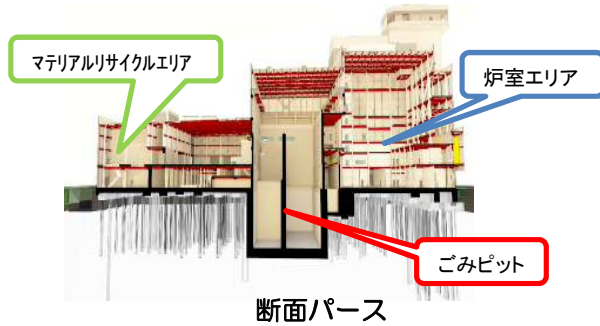

断面パース



H29年7月 駐車場棟基礎工事状況



H29年8月 外装工事状況



H29年8月 鉄骨建て方状況

『今後予定工事』

○ プラザ棟工事



イメージ図

建築工事については、来年よりプラザ棟建築工事に着手いたします。来訪者を温かく迎える施設として、エントランスホール、ホールギャラリー、エコキッズパーク、大会議室、屋上緑化等の施設を建設していきます。

○ プラント工事



参考写真

9月からプラント工事が本格着工し、マテリアルリサイクル施設機器から炉体鉄骨への作業と移っていきます。大型重機設置に伴い、作業員や搬入車両も多くなります。現場の進捗状況を把握し、日々の調整と連携を行いながら安全第一で進めて参ります。
